


FASE 1

DURATA: 3 mesi

- Demolizione recinzione privata
- Modifica dei sottoservizi interni all'area
- Formazione di un parte di rotonda e di pista ciclopedonale


*Nessuna modifica viabilistica
**Semafori in funzione

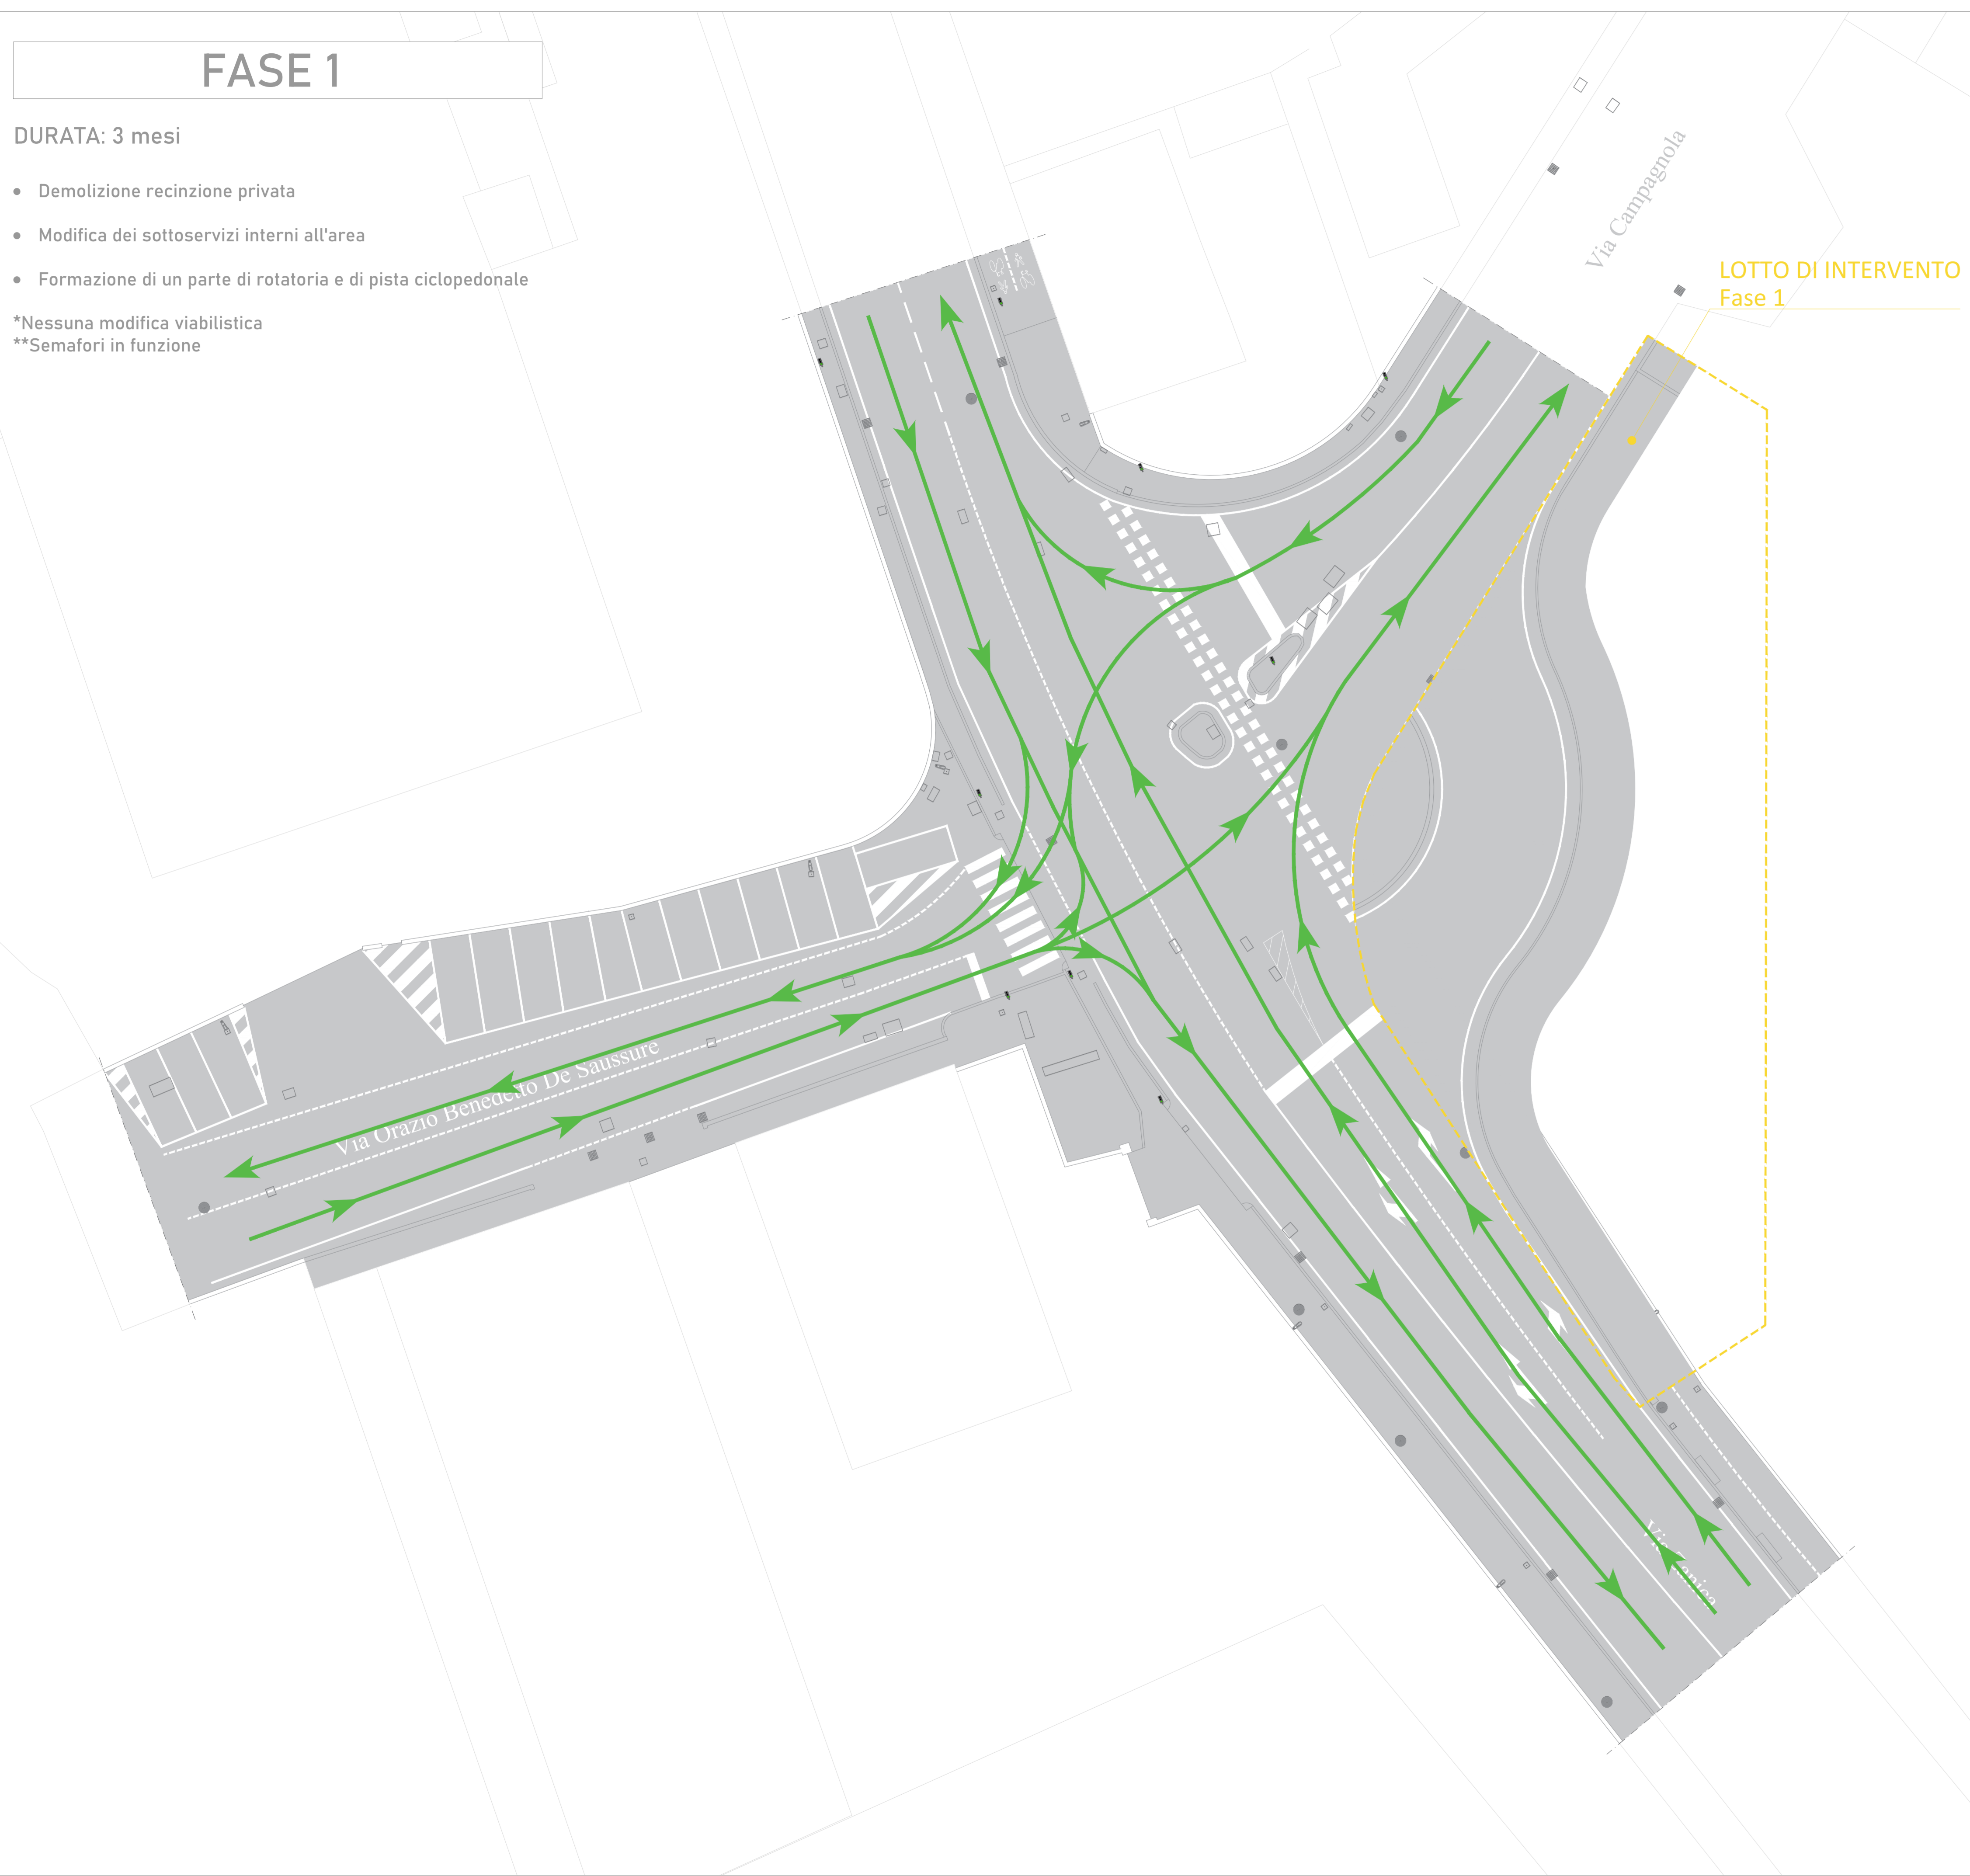

FASE 2

DURATA: 2 mesi


- Formazione svincoli della rotonda
- Formazione parte centrale della rotonda
- Dismissione semafori esistenti

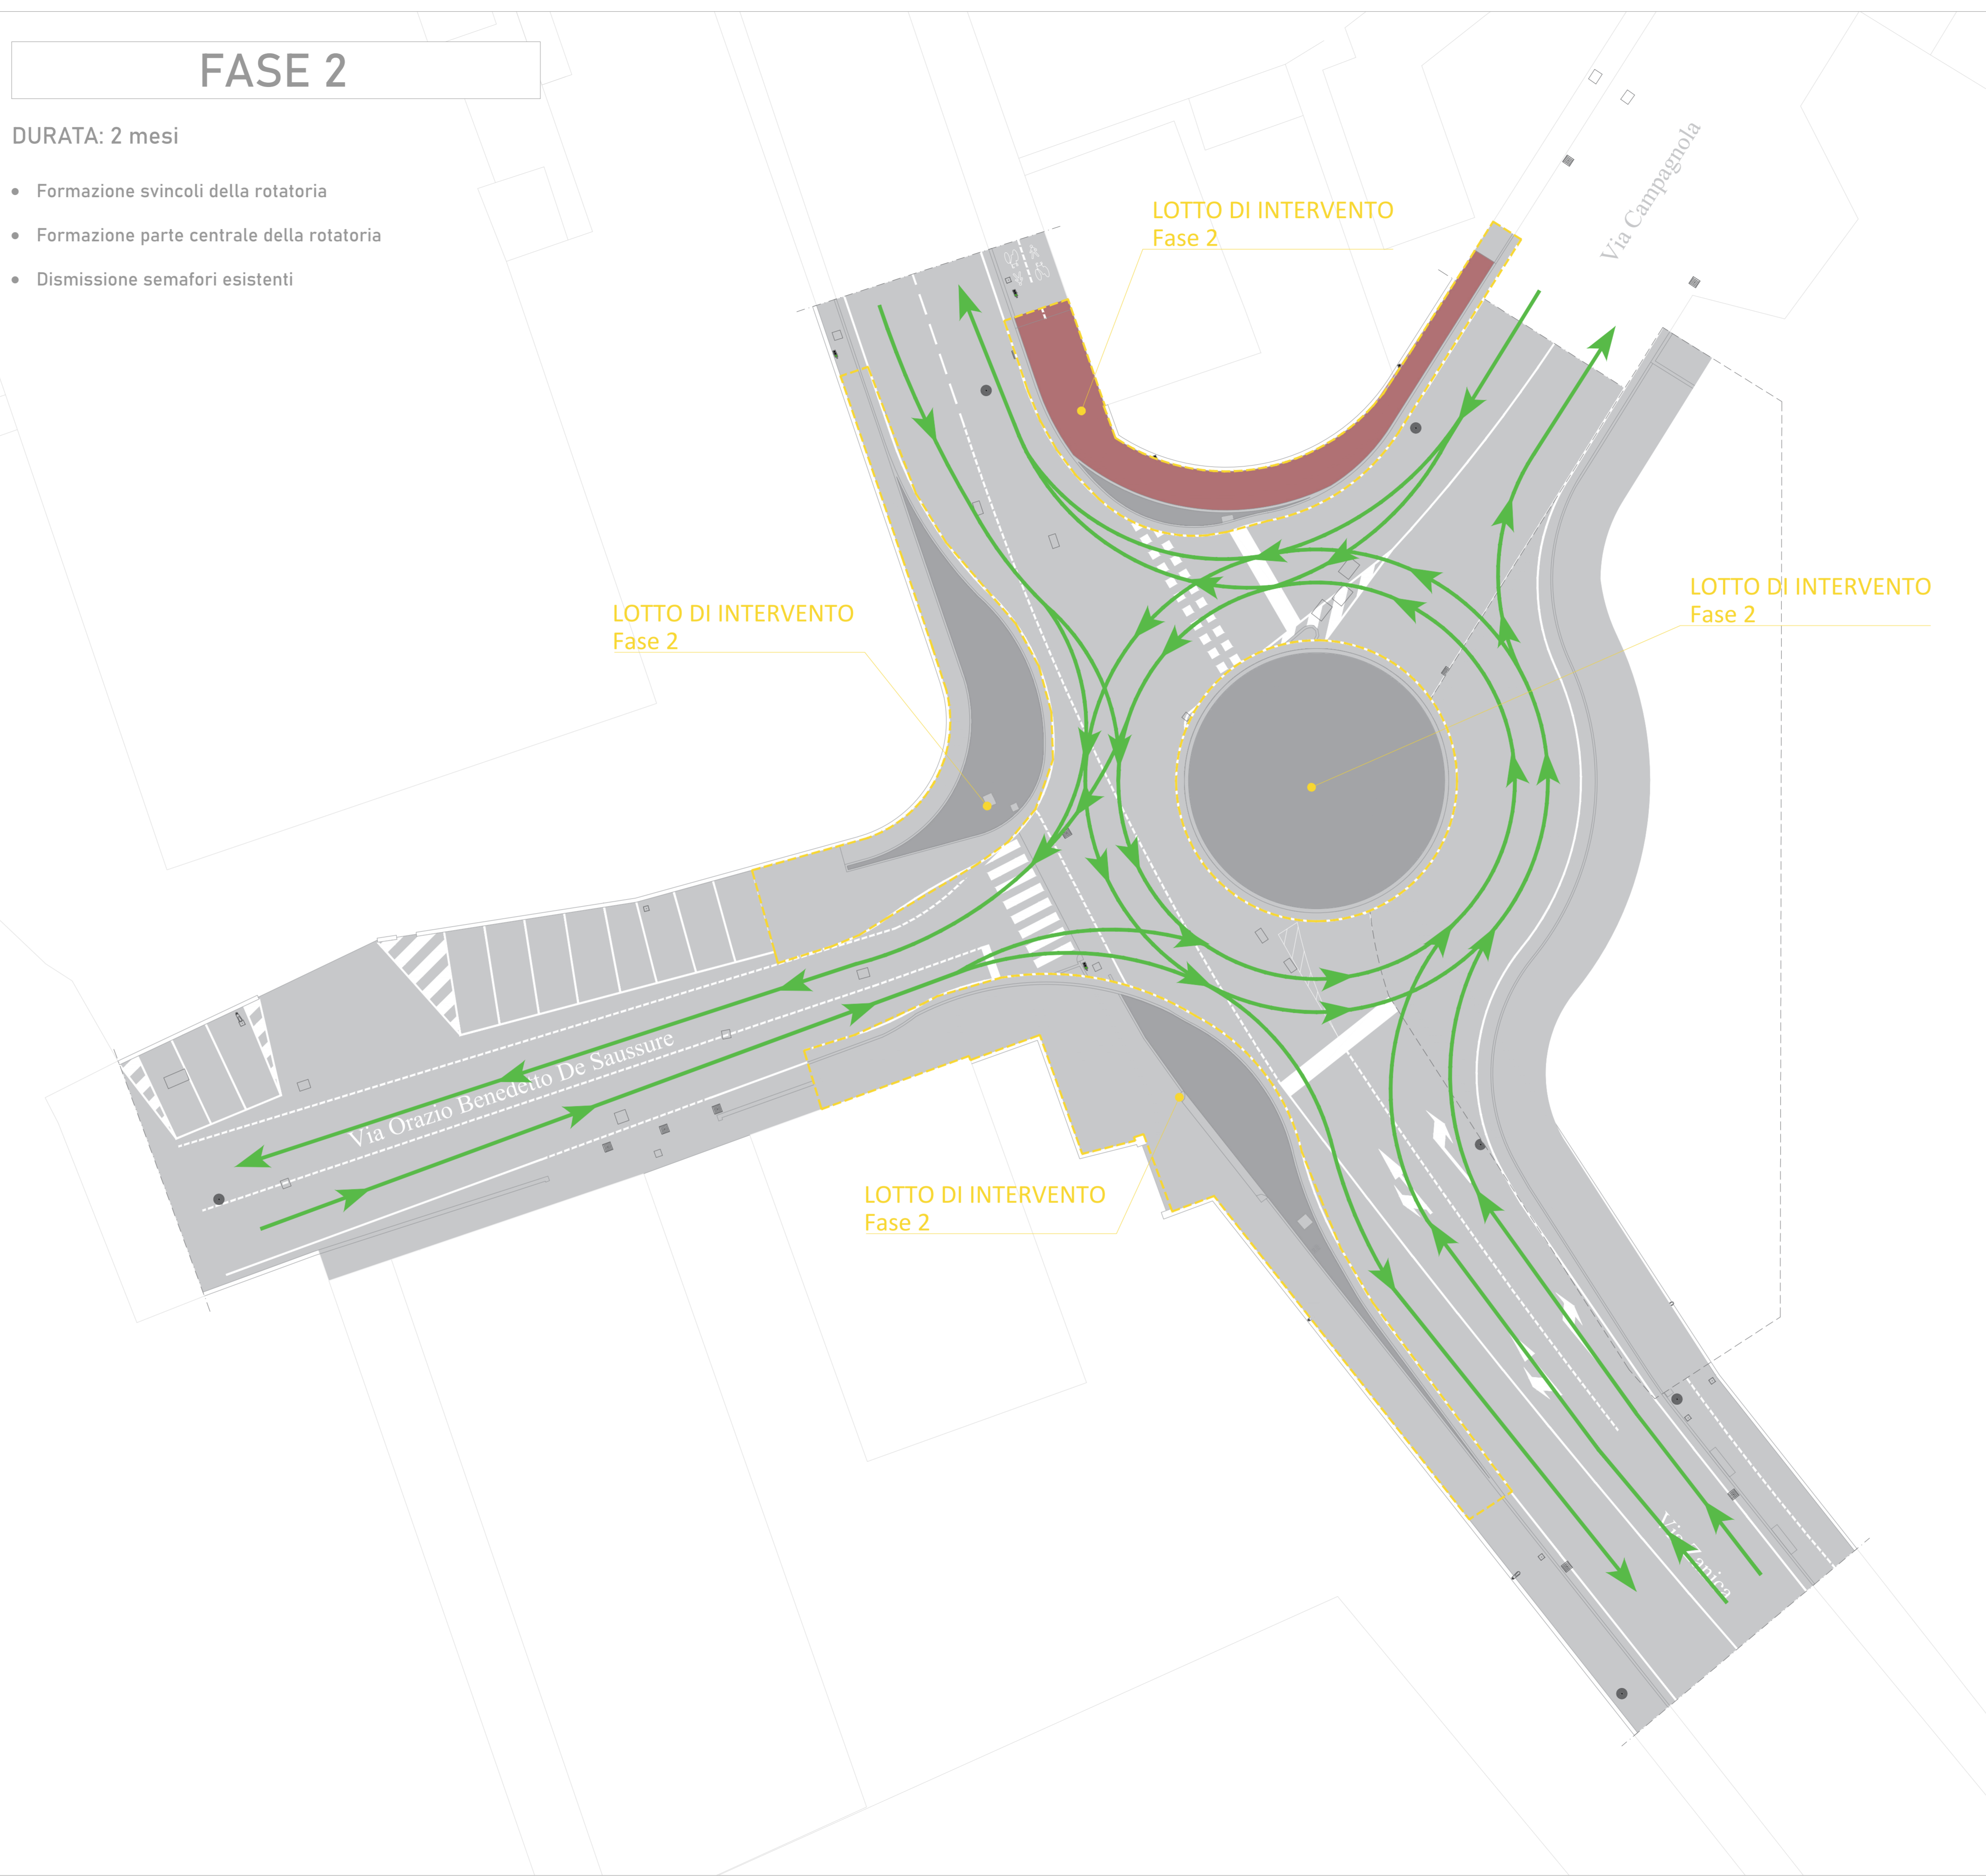

FASE 3

DURATA: 1 mese

- Formazione isole di traffico
- Predisposizione della segnaletica generale

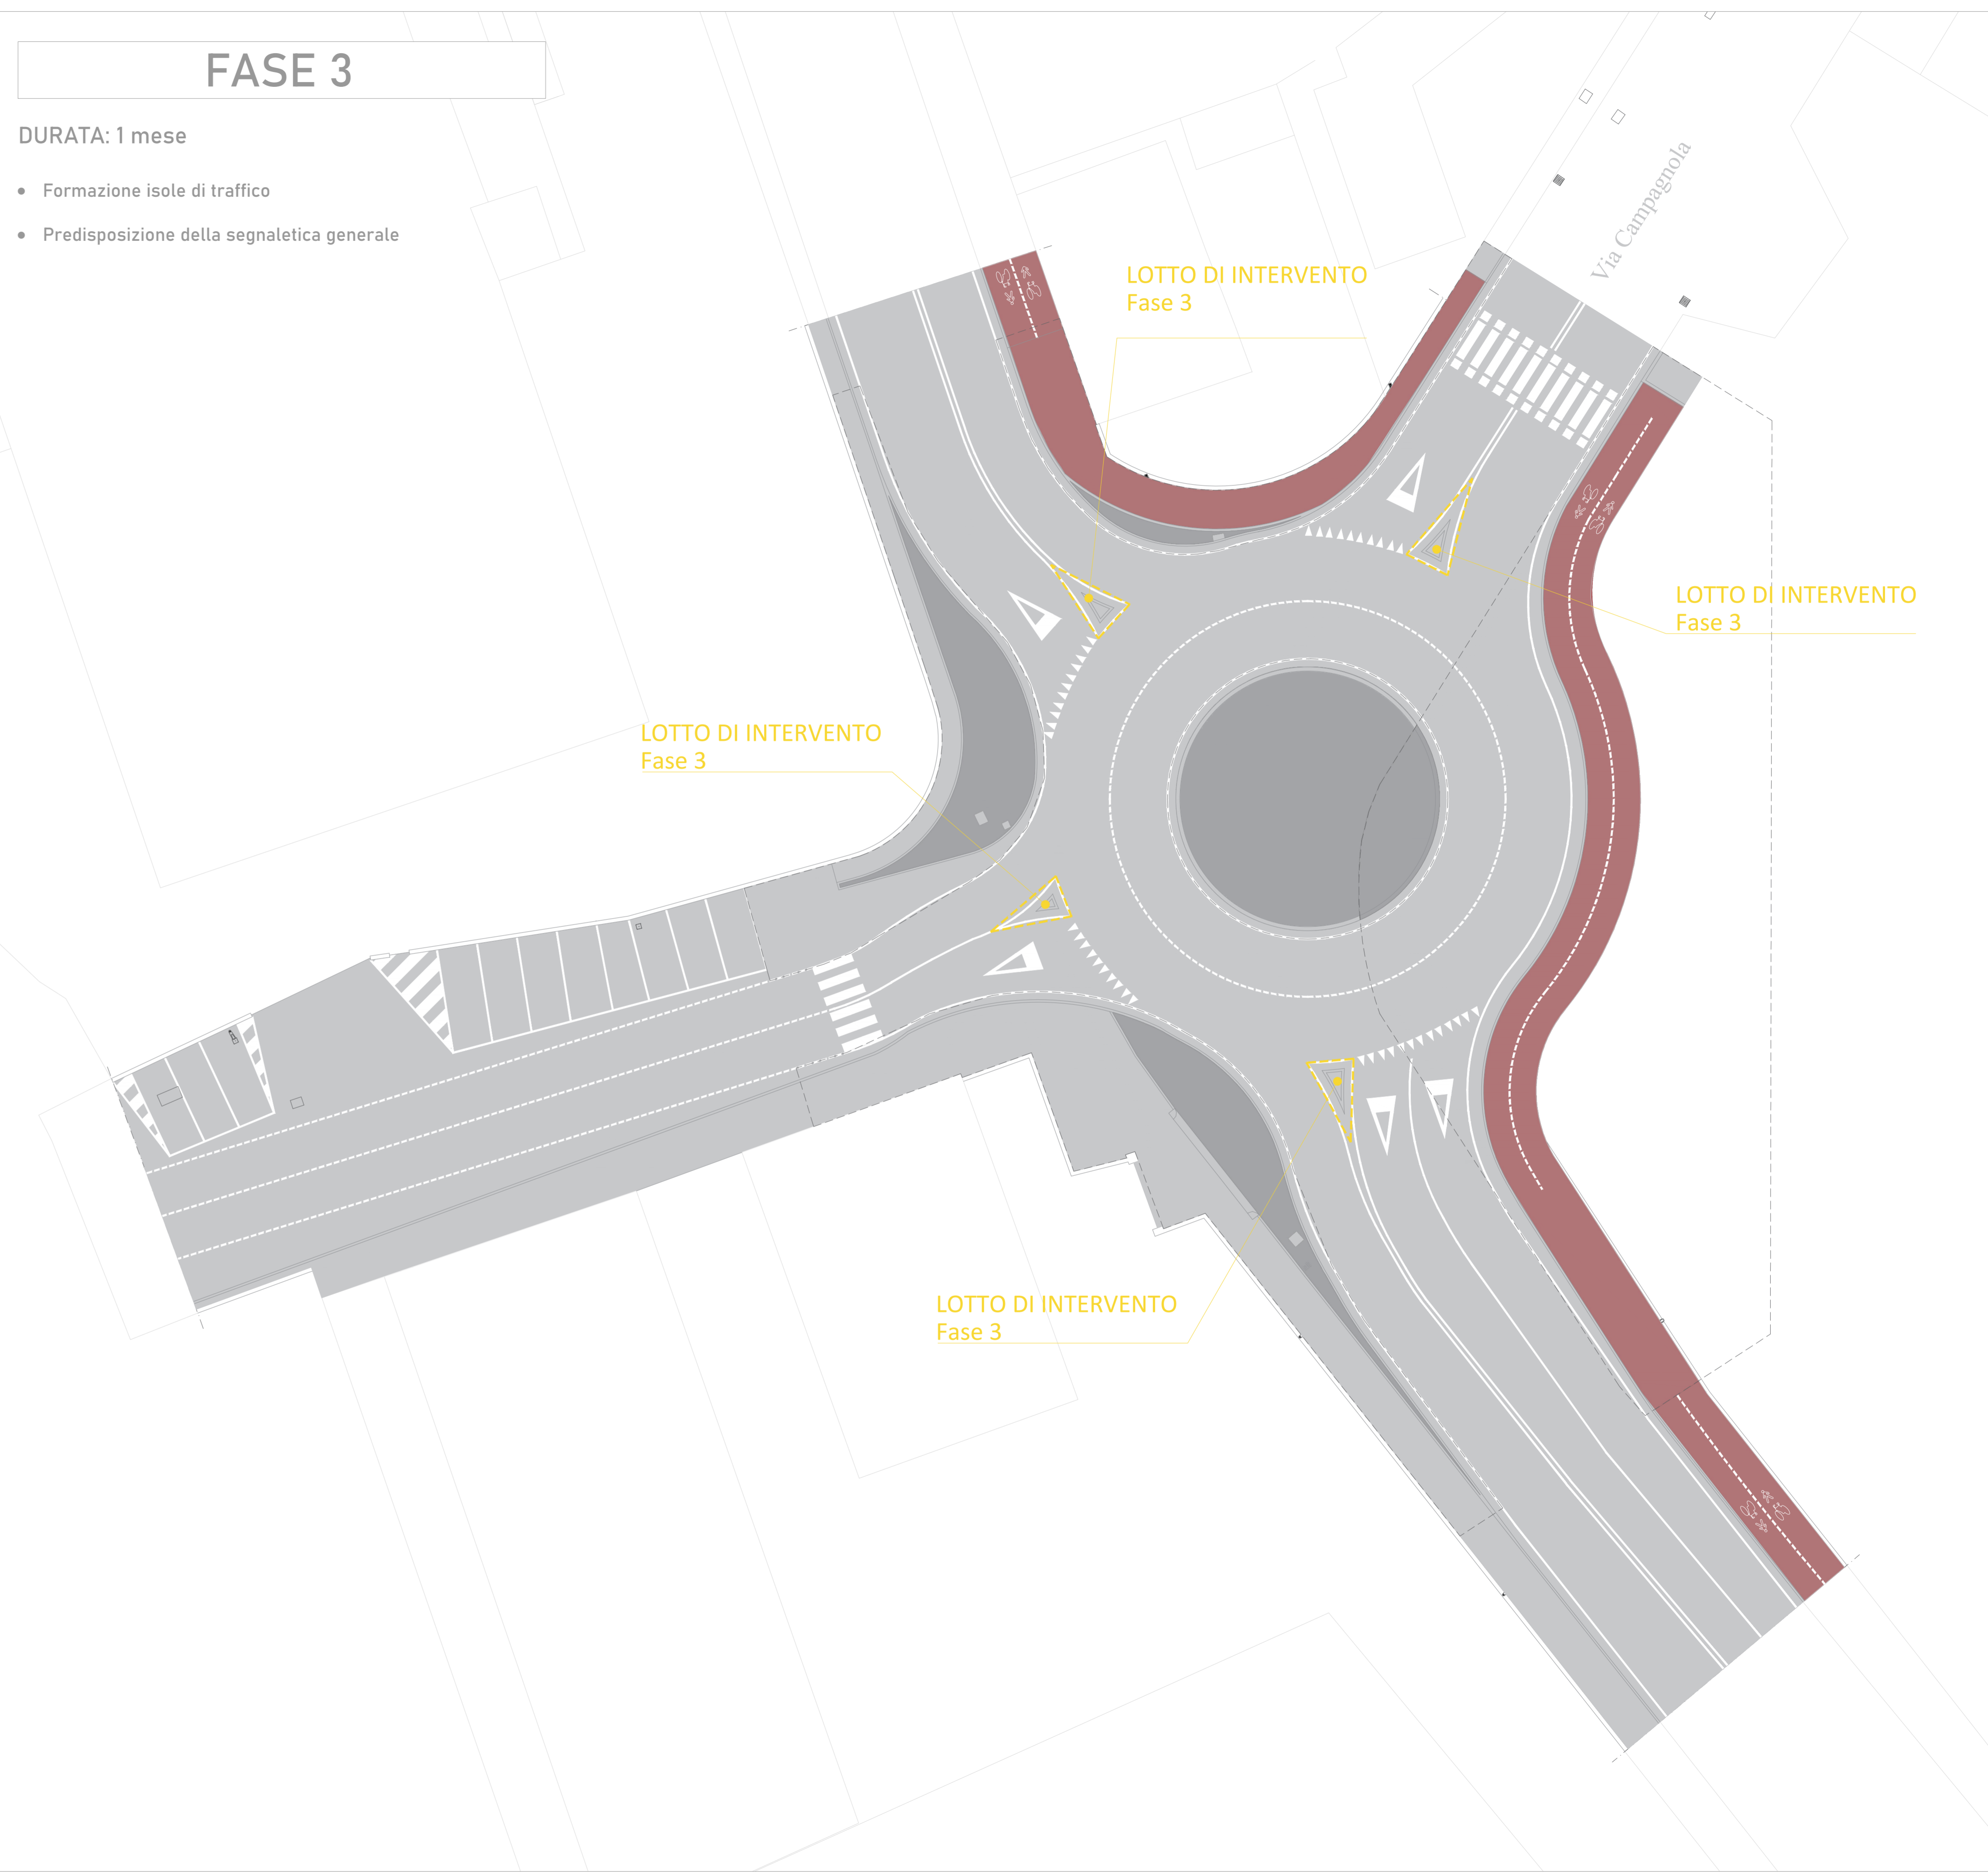

LEGENDA
 Area di cantiere
 Percorsi veicolari

PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 D.Pr. 380/2001, artt. 19 e 19-bis L. 241/1990 e artt. 5,6 e 7 D.Pr. 160/2010

COMITENTE
VITALI S.p.A.
via Lombardia n. 2/a
20068 - Piacenza (PR)



AZA S.p.A.
via Lamarmora n. 230
20124 - Brescia (BS)



PROGETTO
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Intervento di riqualificazione ex centro servizi
Ambito di Trasformazione At_e/s 38 UMI e UMI2
Bergamo (BG) via Cremasca

COMUNE
BERGAMO
AZZANO SAN PAOLO
ORIO AL SERIO

studioCARRARA ARCHITETTO INGEGNERIA
MARCO CARRARA INGEGNERE | ARCHITETTO

DATA: 11.12.2023
FASE: PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO: PDC_2348_2_E.CT.08.PL_00
SCALA: 1:500

CANTIERIZZAZIONI
VIABILITA' TEMPORANEA CANTIERI STRADALI

REV	DATA	EMISSIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	11.12.2023	Prima emissione	M. Carrara	M. Carrara	M. Carrara
